




OBJEDNATEL	<b>Magistrát města Brna</b> Odbor dopravy Kounicova 67, 601 67 Brno	<b>B   R   N   O</b>
------------	---	----------------------

ZHOTOVITEL			<div></div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div>	
<div><b>PK OSSENDORF s.r.o.</b></div> <div>Tomešova 1, 602 00 BRNO</div>				
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. NOVÁK		ČÍSLO ZAKÁZKY	2017-191
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. HRUBAN		ODPOVĚDNÁ SKUPINA	KONCEPCE

ZODP. PROJEKTANT	ING. STANĚK	 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>	
VYPRACOVAL	-		
KONTROLOVAL	ING. ŠTĚPÁNKOVÁ		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KAT. ÚZ.: STARÉ BRNO [610089]	DATUM	04 / 2018
AKCE/STAVBA	<b>KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ MENDLOVA NÁMĚSTÍ</b>	FORMÁT	-
		STUPEŇ PD	TS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	2017-191
		MĚŘÍTKO	-
ČÁST PD/PŘÍLOHA			ČÍSLO PARÉ
<b>ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ</b>			<b>C</b>

## 1. ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Nacenění bylo stanoveno odborným odhadem, dle cen z obdobných staveb a je součástí samostatné přílohy této dokumentace.

Jedná se o orientační návrh zahrnující pouze stavební náklady, který slouží pouze pro porovnání variant a musí být dále upřesněn. Součástí návrhu stavebních objektů nejsou přeložky inženýrských sítí a další související objekty, které budou upřesněny v dalším stupni PD. Do nákladů nebyly kalkulovány výkupy pozemků.

## 2. VARIANTY ŘEŠENÍ

### Varianta A

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF.	230 725 000 Kč
PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF.	10 661 000 Kč
CHODNÍKY	104 315 000 Kč
CYKLOSTEZKY	2 262 500 Kč
NÁSTUPIŠTĚ	7 252 000 Kč
TERÉNNÍ ÚPRAVY	5 667 500 Kč
DÉLKA KOLEJÍ	234 600 000 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>595 483 000 Kč</b>



## Varianta B

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF.	235 555 000 Kč
PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF.	10 661 000 Kč
CHODNÍKY	100 162 500 Kč
CYKLOSTEZKY	2 262 500 Kč
NÁSTUPIŠTĚ	7 252 000 Kč
TERÉNNÍ ÚPRAVY	5 479 000 Kč
DÉLKA KOLEJÍ	234 600 000 Kč

## **CENA CELKEM**

**595 972 000 Kč**






## 3. ETAPY VÝSTAVBY

### ETAPA 1

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF.	89 960 000 Kč
PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF.	5 257 000 Kč
CHODNÍKY	55 620 000 Kč
CYKLOSTEZKY	1 490 000 Kč
NÁSTUPIŠTĚ	0 Kč
TERÉNNÍ ÚPRAVY	1 728 500 Kč
DÉLKA KOLEJÍ	71 850 000 Kč


**CENA CELKEM**

**225 905 500 Kč**

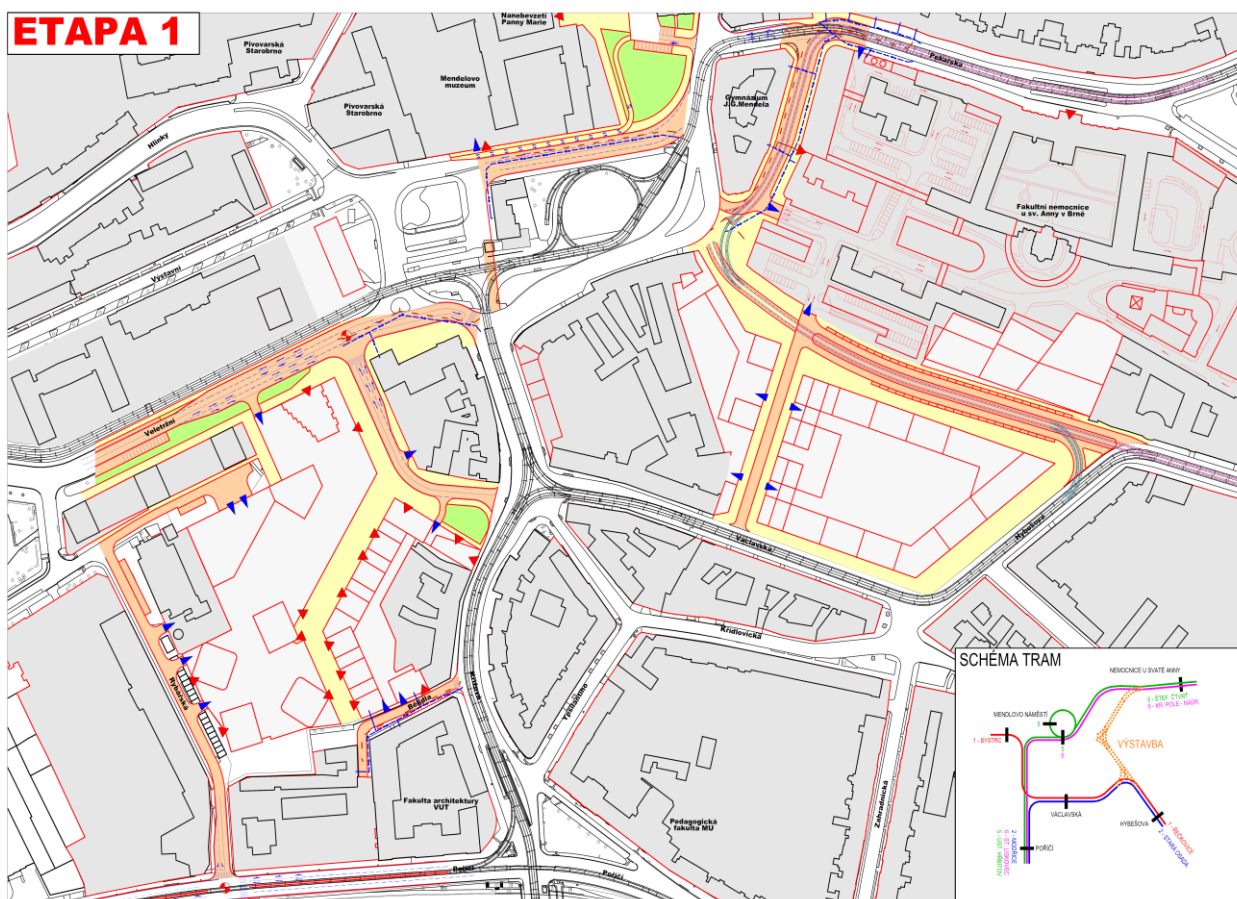

## ETAPA 2

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF.	13 315 000 Kč
PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF.	0 Kč
CHODNÍKY	15 085 000 Kč
CYKLOSTEZKY	0 Kč
NÁSTUPIŠTĚ	5 922 000 Kč
TERÉNNÍ ÚPRAVY	452 500 Kč
DÉLKA KOLEJÍ	38 350 000 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>73 124 500 Kč</b>

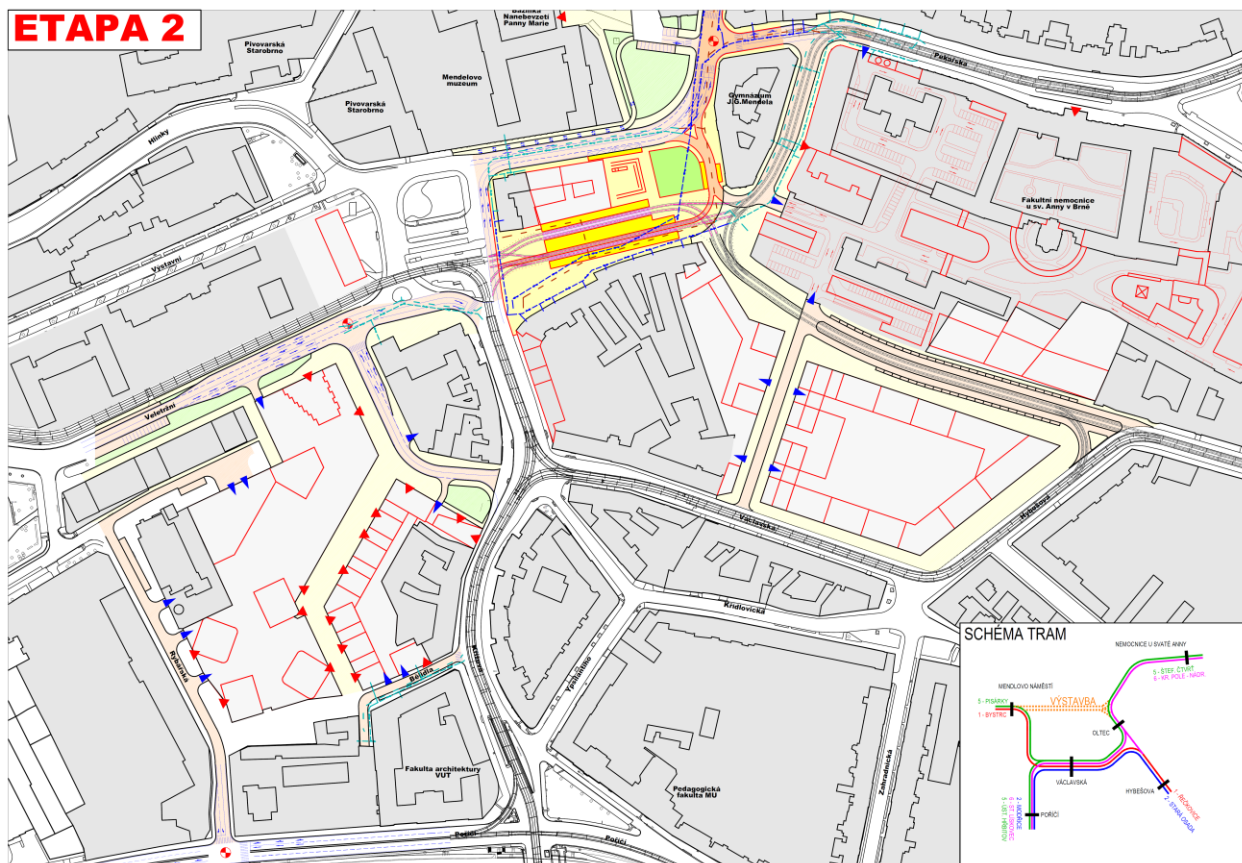


## ETAPA 3

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF.	120 655 000 Kč
PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF.	5 453 000 Kč
CHODNÍKY	31 175 000 Kč
CYKLOSTEZKY	1 002 500 Kč
NÁSTUPIŠTĚ	1 281 000 Kč
TERÉNNÍ ÚPRAVY	3 114 500 Kč
DÉLKA KOLEJÍ	129 400 000 Kč

## CENA CELKEM

**292 081 000 Kč**

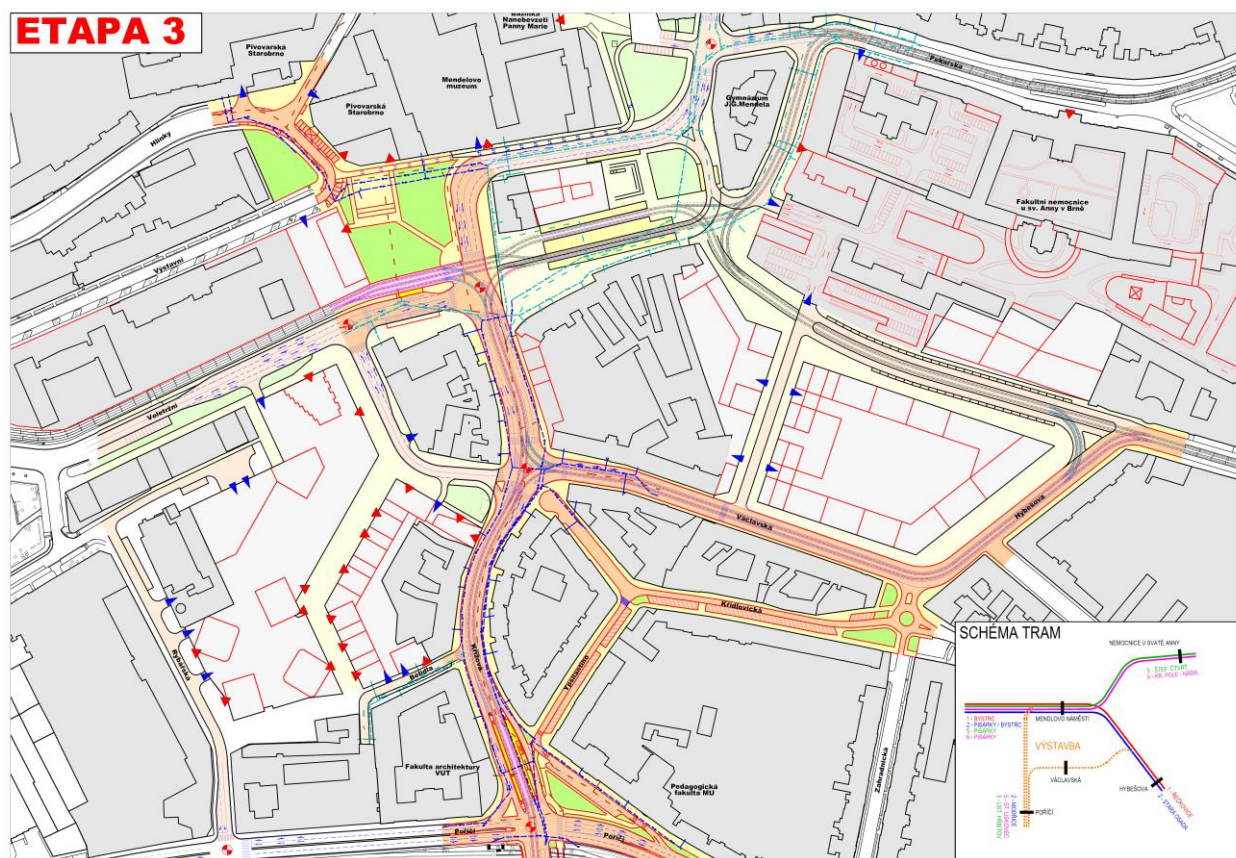





## 4. PODMIŇUJÍCÍ STAVBA

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF.	10 875 000 Kč
PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF.	747 000 Kč
CHODNÍKY	6 662 000 Kč
SJEZDY	335 000 Kč
TROLEJOVÉ VEDENÍ	2 900 000 Kč

**CENA CELKEM 21 519 000 Kč**

